

3 計画の推進に向けて

基本計画の基本理念「未来へつなぐ杜の都の水の道～市民・事業者との協働～」のもと、目指す3つの「将来像」の実現に向けて、12の「施策の基本的方向性」に沿って本計画に掲げる各事業を推進します。


○毎年度及び計画全体の進捗管理

本計画に掲げる事業は、経営環境やお客さまニーズの変化等に適切に対応しながら、毎年度の予算編成や事業計画策定の中で具体化し、事業実施後の評価を踏まえて次年度以降の事業計画へ反映する等、PDCAサイクルによる進捗管理を実施していきます。

また、次期中期経営計画の策定にあたっては、計画全体の進捗状況評価や、社会情勢の変化等も踏まえて事業見直しを行い、その内容を反映していきます。

○事業進捗に対する外部評価の実施

事業の進捗状況や今後の事業計画については、外部の有識者で構成する「(仮称) 仙台市水道事業経営検討委員会」において評価を受け、次年度以降の事業計画等に反映します。

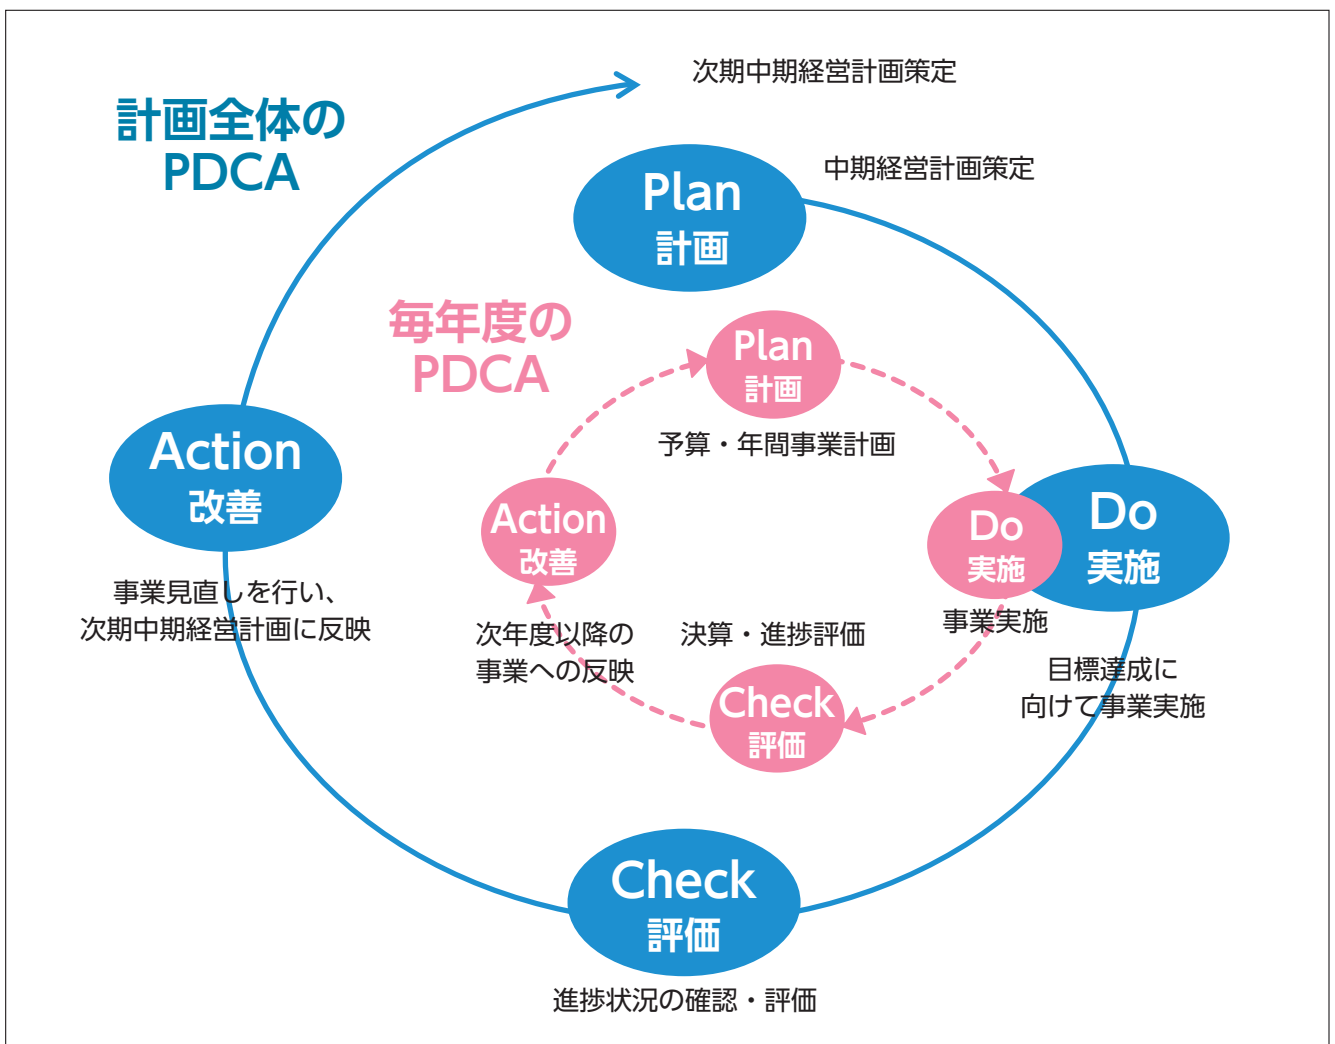

進捗管理のイメージ

○本計画に掲げる事業ごとのスケジュールについて

本計画では事業ごとに令和2年度から令和6年度までの5年間のスケジュールを示していますが、これは計画策定時（令和元年度末）における事業予定や検討手順の一例を示したものです。各年度の進捗状況や外部環境の変化、今後の見通し等を踏まえて、スケジュールを適宜見直していきます。

【見直しの例】

- ・令和元年度末に予定している5年間のスケジュール

	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
浄水場	茂庭浄水場濃縮槽・汚泥貯槽耐震化		茂庭浄水場ろ過池・浄水井・ポンプ井耐震化		茂庭浄水場長寿命化
配水所	大倉配水所耐震化		国見低区第二配水池耐震化		
			坪沼配水所耐震化		
			青野木配水所耐震化		
ポンプ場	湯元送水ポンプ場耐震化			将監送水ポンプ場耐震化	



- ・実績を踏まえて、以降のスケジュールを更新

	実績を反映		実績を踏まえて、スケジュールを見直し		
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
浄水場	茂庭浄水場濃縮槽・汚泥貯槽耐震化 (完了)		茂庭浄水場ろ過池・浄水井・ポンプ井耐震化		茂庭浄水場長寿命化
配水所	(着手)	大倉配水所耐震化 (完了)	国見低区第二配水池耐震化		(~R6完了)
			坪沼配水所耐震化		(~R6完了)
			青野木配水所耐震化		
ポンプ場	(着手)	湯元送水ポンプ場耐震化 (継続)	(~R4完了)		将監送水ポンプ場耐震化 (R6より着手)

中期経営計画の進捗状況については、毎年度、水道局ホームページでお客さまへお知らせします。

